Vol.50
令和８年９月

～新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備について～

県・エコサイクル高知からのお知らせ

※工事区域の現在の状況については、中面（2・3ページ）をご覧ください。

当工事では、地域の皆さまと現場で働く作業員の「安全・安心」を第一に、施設整備工事を進めています。ここでは、施設本体工事を施工している大林ＪＶが取り組んでいる安全対策や、現地で活用している最新の機材・技術などをご紹介します。

クリーンな電動式クレーンを現場に導入

ＪＶの一員である大林組では、国土交通省が推進する環境に優しい建設機械の普及促進を図っており、その取り組みの一つとして、今月から現場に電動クレーン（25トン吊り）を導入しています。

ガソリンや軽油を燃料とする従来の発電機に代わり、クリーンな電気をエネルギーとして活用する環境に配慮した優れものです。

このように、建設現場における環境負荷の低減を図り、脱炭素社会の実現に資する取り組みを進めています。



最新技術を活用した「安全・安心」な工事

作業員の安全を見守るウェアラブルデバイス

全作業員が熱中症対策として「ウェアラブルデバイス」を使用しています。作業員の体調の変化を継続的に見守り、熱中症の危険が高まった際にアラーム等を発することで、作業員の熱中症の未然防止を図っています。



深部体温の上昇を検知
アラーム等でリスクを通知

ICTを活用した工事用車両の運行管理

工事現場へ出入りする車両に「工事用車両運行支援システム」を導入しています。車両の位置情報をリアルタイムに運転手が共有し、車両同士の適切な間隔を保つことで、交差点付近での車両の集中を抑え、渋滞の軽減や交通事故の防止に努めています。



【問合せ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
電　話：０８８９－２２－４７４４
ＦＡＸ：０８８９－２２－４７６４
メール：info@ecokochi.or.jp
〒789-1201　高岡郡佐川町甲1650番１号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
電　話：０８８－８２１－４５９５
ＦＡＸ：０８８－８２１－４５２０
メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

工事区域の現在の状況（施設本体工事・進入道路整備工事）



斜面対策工事が完了し、表面保護のための緑化も順調に進んでいます。



地下貯水部が完成し、水漏れがないか確認する検査を行っています。



排水ボーリングや法枠工など、今年3月に発生した斜面の緩みへの対策工事が完了しました。





屋根を架けるための足場の設置が進むとともに、被覆施設の外柱の組立ても始まりました。

屋根を支える中柱の最上段（4節目）を吊り下ろしています。





谷部の擁壁工事など、施設本体へ続く道路工事が進んでいます。

環境モニタリング（令和８年8月測定）の結果について

環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。（降下ばいじんは、7月22日～８月25日の約１か月間の測定結果です。）

１ 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度


地点	測定項目	R8.6.22	R8.7.22	R8.8.25	基準値※1
①	浮遊物質量	3	2	1	25
	濁　度	1.4	0.8	0.5	－
②	浮遊物質量	8	9	4	25
	濁　度	5.2	6.0	1.4	－
③	浮遊物質量	9	10	6	25
	濁　度	5.6	6.8	2.0	－
④	浮遊物質量	3	2	2	25
	濁　度	2.2	1.5	1.3	－

※1　日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。
　なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

２ 井戸水

調査は、年４回（季節ごと）実施する計画です。
次の調査は10月下旬の予定です。

モニタリング地点

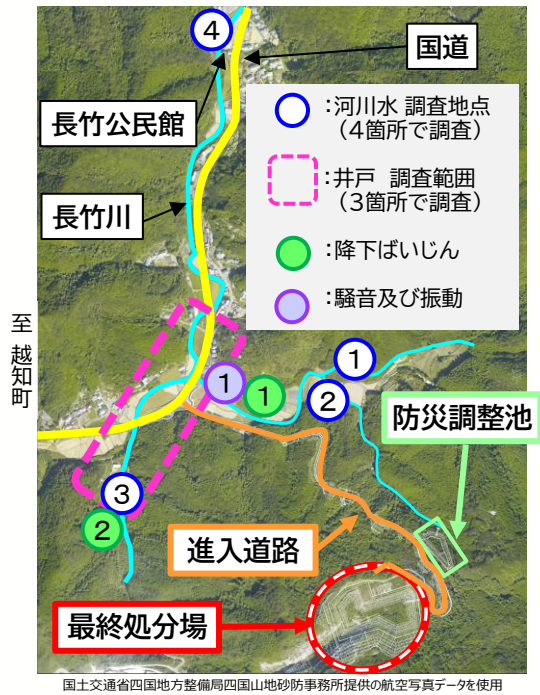

３ 降下ばいじん

地点	R8. 5. 25 ～6.22	R8. 6. 22 ～7.22	R8. 7.22 ～8.25	基準値※2
①	0.48	0.90	1.60	10
②※3	2.57	1.76	6.21	10

②地点の数値上昇は、動物による掘り起こしの影響と考えられます。

※2　環境影響評価で定めた参考指標　（単位）t/km²/月

※3　令和5年4月から測定

４ 動物（猛禽類）

調査は、４月から８月にかけて実施する計画です。結果については、期間中の調査結果を取りまとめてお知らせします。

環境モニタリングの様子



河川水



降下ばいじん



動物（猛禽類）

環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた（株）東洋技研【高知市】が実施しています。

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

◆ これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」

◆「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ
（URL :https://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html ）

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧いただけます。
