県・エコサイクル高知からのお知らせ

工事区域の現在の状況

１　施設本体工事

被覆施設の屋根を支える鉄骨部材の設置が進んでいます。東側では外柱の設置も進んでおり、施設の全体像が徐々に見えてきました。





トラス構造（鉄骨を三角形に組み合わせて強度を高める構造）の鉄骨部材の設置が進んでいます。

２　進入道路整備工事

国道33号から520m付近では、谷を横断する路側擁壁の工事が完了し、道路の高さを確保するための盛土を進めています。また、650m付近では、山側の掘削工事を進めています。



令和８年10月９日撮影



令和８年10月９日撮影

【問合せ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
電　話：０８８９－２２－４７４４
ＦＡＸ：０８８９－２２－４７６４
メール：info@ecokochi.or.jp
〒789-1201　高岡郡佐川町甲1650番１号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
電　話：０８８－８２１－４５９５
ＦＡＸ：０８８－８２１－４５２０
メール：030801@ken.pref.kochi.lg.jp
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

進入道路の交差点工事・水道敷設工事の施工業者が決定しました

９月２日に入札を行い、以下のとおり施工業者が決定しました。工事の詳細については、次号以降でお知らせします。

交差点工事

国道33号の越知町側からの右折車線の設置を中心に、進入道路への交差点を整備します。

受 注 者 ： ミタニ建設工業㈱（高知市）

施工期間： 令和８年９月～令和９年４月

水道敷設工事

進入道路への交差点整備工事に伴う水道管の移設と、施設本体への水道管の引き込みを行います。

受 注 者 ： 東邦工業㈱（高知市）

施工期間： 令和８年９月～令和９年５月

環境モニタリング（令和８年９月測定）の結果について


環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。（降下ばいじんは、8月26日～9月24日の約１か月間の測定結果です。）

１ 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R8.7.22	R8.8.25	R8.9.24	基準値※1
①	浮遊物質量	2	1	1	25
	濁 度	0.8	0.5	0.6	－
②	浮遊物質量	9	4	4	25
	濁 度	6.0	1.4	2.7	－
③	浮遊物質量	10	6	6	25
	濁 度	6.8	2.0	2.6	－
④	浮遊物質量	2	2	2	25
	濁 度	1.5	1.3	1.2	－

※1 長竹川の本川である日下川が環境基準類型Aに指定されているため、浮遊物質量は類型Aの環境基準値を採用。なお、濁度には環境基準値がないが、浮遊物質量と相関があるため、併せて測定。

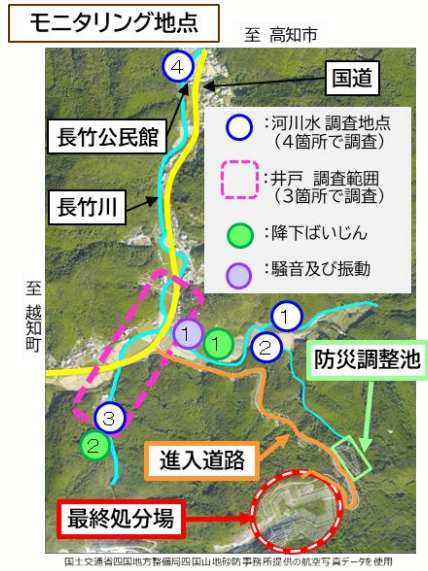

２ 井戸水

調査は、年４回（季節ごと）実施する計画です。

次の調査は10月下旬の予定です。

３ 降下ばいじん

地点	R8. 6. 22 ～7.22	R8. 7.22 ～8.25	R8. 8.26 ～9.24	基準値※2
①	0.90	1.60	0.96	10
②※3	1.76	6.21	2.00	10

※2 環境影響評価で定めた参考指標 （単位）t/km²/月

※3 令和5年4月から測定

４ 動物(猛禽類)

猛禽類の一種であるサシバについて、本年度（４月～８月）の繁殖状況等をモニタリングしました。

工事区域周辺では、餌運びや巣作り、幼鳥の確認など、繁殖に関係する行動が確認されました。これらの確認地点はいずれも工事箇所から離れており、工事による影響はなかったと考えています。

来年度も同時期にモニタリングを行い、必要に応じて保全措置を実施します。

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

◆ これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」

◆「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ

（URL :https://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html ）

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧いただけます。
